




RD42

Aménagement de la route d'Arnac
du PR37.010 au PR33.750


Avancement au 06.04.2022

RD42 St-Santin Cantalès: Profils types

Rechargement 0.15+0.05

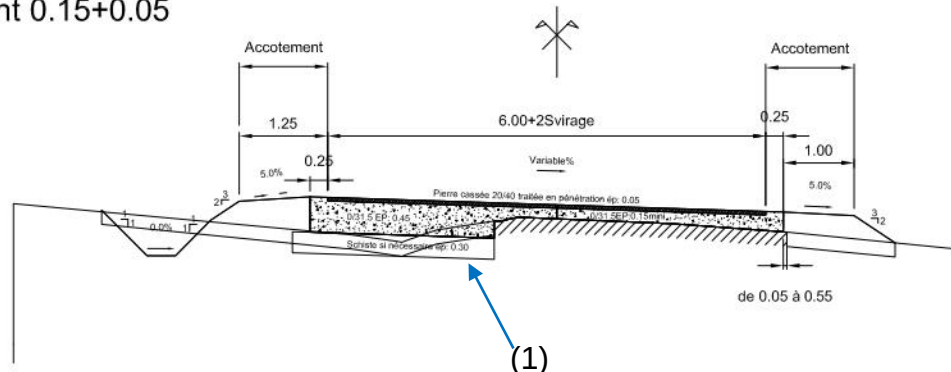

Rechargement 0.25+0.05
Du P58 au P89 et du P154 au P183

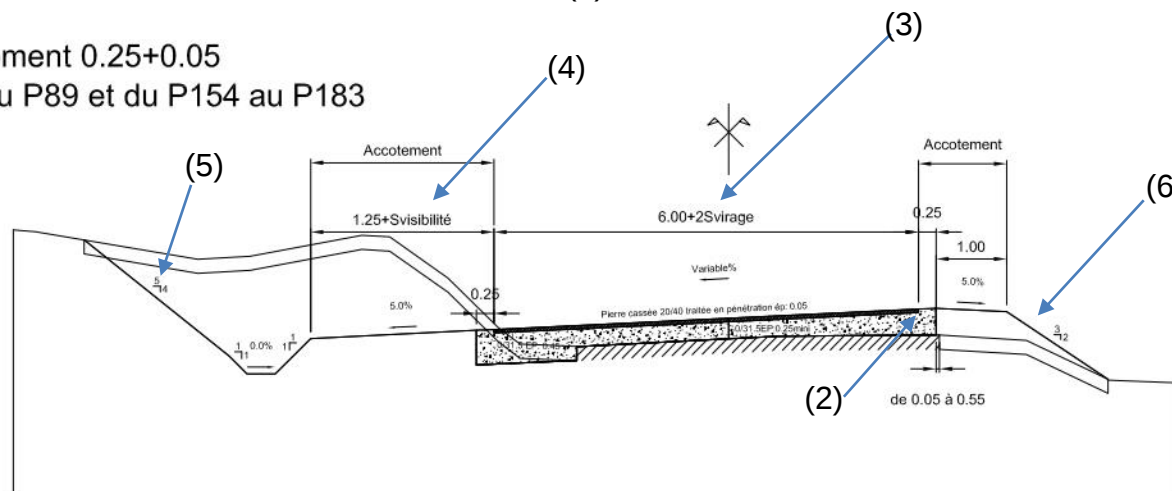

D'une manière générale en plan, le bord droit de la chaussée existante est décalé de 30 à 80 centimètres afin que la structure en 0,315 repose sur du dur. Des purges seront effectuées si nécessaire (1) .

Il n'est pas constitué de droites et de cercles tangents mais de segments droits dont le tracé suit méticuleusement l'actuel.

Ce bord droit (2) ainsi défini est décalé de 6m pour avoir le corps de chaussée correspondant et les surlargeurs en virage **Svirage** (3) y sont appliquées. (25/R pour chaque voie)

Des surlargeurs **Svisibilité** (4) en accotement sont appliquées afin de donner de la visibilité dans les virages qui le nécessitent.

Les pentes des talus de déblais (5) sont de 80% et non de 1/1 afin de ne pas avoir plus tard des glissements et aussi une meilleure esthétique.


Un fossé est créé afin d'assainir la fondation de la structure.

Les talus de remblais (6) ne sont pas habillés de terre végétale afin de stabiliser l'accotement sur toute sa largeur.

RD42 St-Santin



Situation

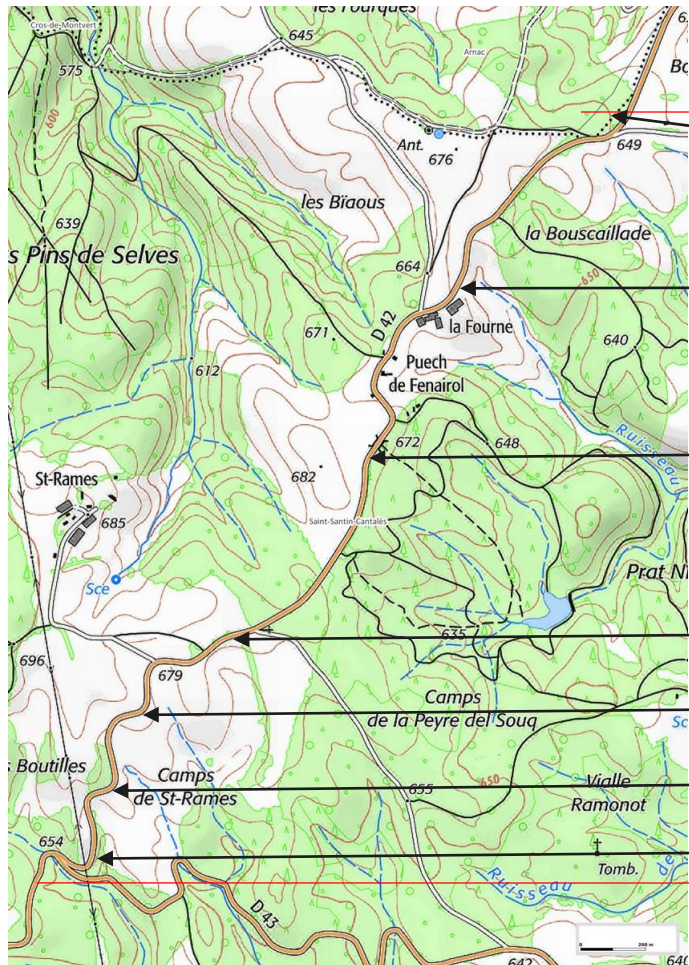

Fin du chantier

Zone 7

Zone 6

Zone 5

Zone 4

Zone 3

Zone 2

Zone 1

Début du chantier





Après l'implantation des emprises, les bucherons ont procédé à la coupe des arbres. Les engins de chantier ont évacué les haies, les clôtures ainsi que les souches. Le décapage des déblais commence ainsi que la préparation des zones en remblai.

RD42 St-Santin



Zone 1

Le 06.04.2022



Dégagement de visibilité dans le petit rayon.

RD42 St-Santin



Zone 1

Le 06.04.2022



Le décapage "à la petite cuillère".

avant

ce jour



La zone a été déboisée.

RD42 St-Santin



Zone 2

Le 06.04.2022



Le décapage et la purge

RD42 St-Santin



Zone 2

Le 06.04.2022



Décapage du dégagement de visibilité.

RD42 St-Santin



Zone 2

Le 06.04.2022



Le décapage et la purge.

Le cordon de végétale est absent puisque les talus de remblai ne seront pas habillés.

RD42 St-Santin



Zone 3

Le 06.04.2022



Le décapage et la purge.

RD42 St-Santin



Zone 3

Le 06.04.2022



Le décapage "à la petite cuillère".

RD42 St-Santin



Zone 3

Le 06.04.2022



Le fond de fouille est purgé.

avant

ce jour



Le déboisement, le dessouchage et l'enlèvement des clôtures sont terminés jusqu'ici.

RD42 St-Santin



Zone 5

Le 06.04.2022

Le dégagement de visibilité se fait dans l'enceinte d'une chasse privée.



Une clôture provisoire est posée afin que le gibier ne puisse s'échapper durant la mise en place du remblai.

RD42 St-Santin



Zone 5

Le 06.04.2022

Les piquets de clôture sont plantés avec le godet de la pelle.



RD42 St-Santin



Zone 6

Le 06.04.2022



Le poteau devra être reculé.

Ici un câble électrique a été abaissé.



RD42 St-Santin



Zone 7

Le 06.04.2022



La terre végétale est stockée et sera remise en culture sur toute la parcelle.

RD42 St-Santin



Le chef de chantier

Le 06.04.2022



Jean Pascal Esnou a repoussé son départ à la retraite afin pouvoir terminer ce dernier chantier de sa carrière.



FIN
